DOSSIER TECHNIQUE V01.00.00

CUISINE D'EXTÉRIEUR 3,50M — ROOFTOP

Implantation rectiligne sur dalles 50×50 avec assise sous-jacente

LIEU : Lyon (Rooftop)
ÉQUIPE : Baptiste & Son Père
OBJECTIF : Chantier J-14



Conception Validée

Ensemble 100% rectiligne sans retour d'angle, maçonné en béton cellulaire (Siporex 10 cm) et revêtu de béton ciré gris quartz minéral. Aucune charge n'est transmise aux dalles flottantes : l'ouvrage prend appui directement au fond du vide d'étanchéité (-25 cm) sur patins EPDM.

LONGUEUR TOTALE	PROFONDEUR PLAN
HAUTEUR PLAN HAUT	HAUTEUR TABLETTE KOKKO
POSTE PIZZA (GAUCHE)	POSTE BARBECUE (DROITE)

CHRONOLOGIE DE RÉALISATION

DURÉE ESTIMÉE : 2 Week-ends
BÉTON CELLULAIRE : 52 Blocs

LES 4 ÉTAPES CLÉS DU CHANTIER EN SITUATION RÉELLE

Intégration directe sur la terrasse sans retour d'angle, sans guirlande ni palmier



ÉTAPE 01 • PRÉPARATION DU SOL

Dépose de la rangée 2 & Patins EPDM

La 1ère rangée mitoyenne le long des vitres dépolies reste intacte (recul de 20 cm). Seule la 2ème rangée est déposée. Au fond de la tranchée (-25 cm), 6 patins résilients EPDM (100×100×10 mm) sont positionnés sur l'étanchéité bitumineuse sans aucun perçage.



ÉTAPE 02 • MAÇONNERIE BASSE

Montage des 6 jambages verticaux

Le 1er rang Siporex (25 cm) dans le vide arrive pile à fleur des dalles. Les 6 jambages de 10 cm sont montés à la colle cellulaire en alignement rectiligne parfait (zéro retour en L). Assemblage de la tablette basse décaissée à +45 cm pour le Kamado.





DESSINS TECHNIQUES

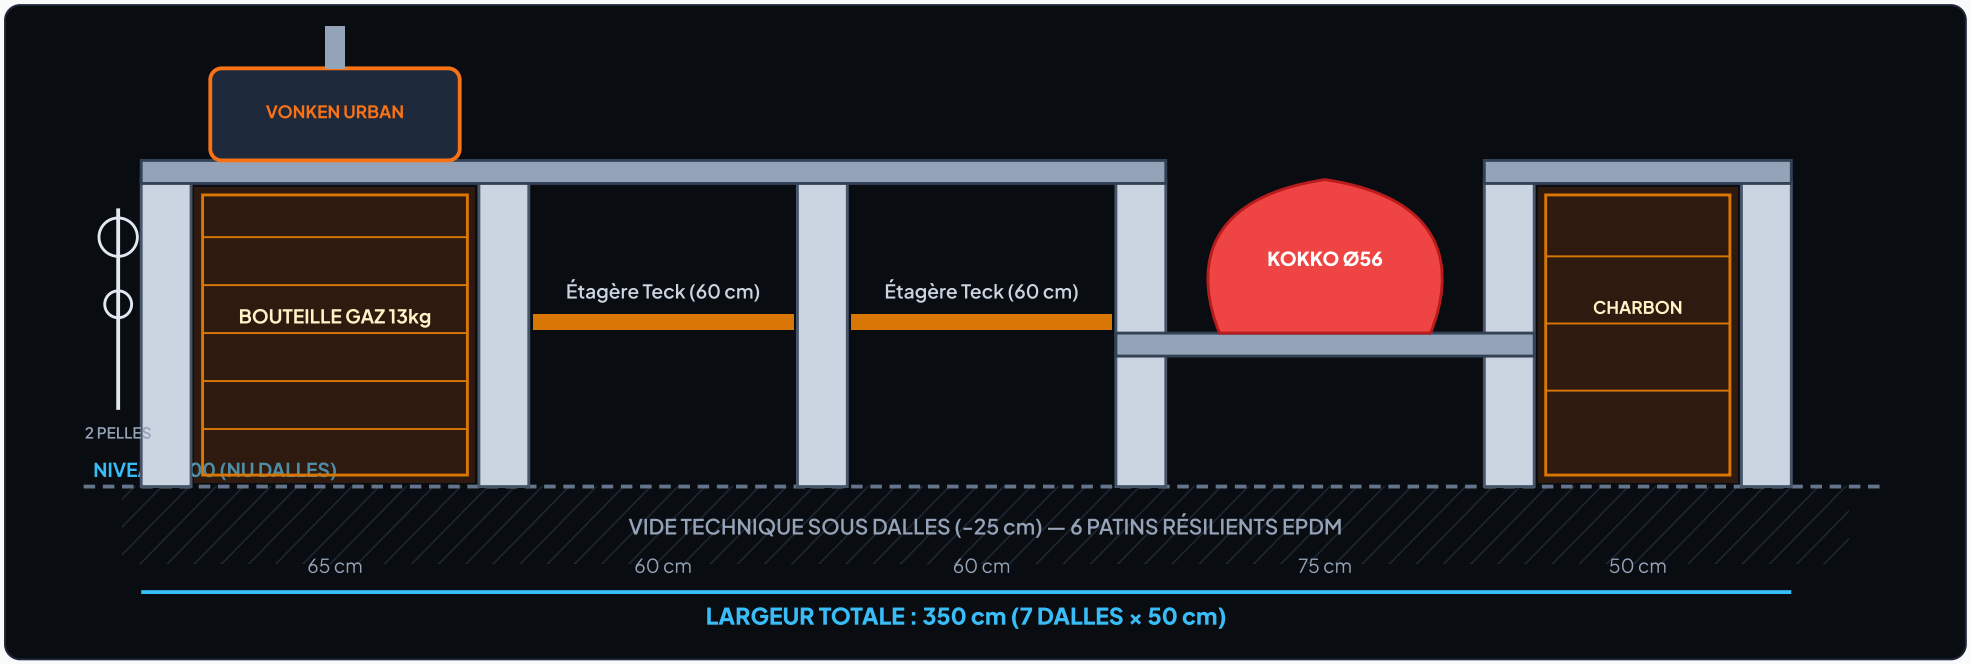
COTES : en centimètres (cm)
ÉPAISSEUR JAMBAGES : 10 cm

PLANS D'EXÉCUTION COTÉS & CALEPINAGE

Vues vectorielles précises : Face (3,50m), Dessus et Coupe Latérale

VUE DE FACE — ÉLÉVATION RECTILIGNE (3,50 MÈTRES)

5 Niches / 6 Jambages de 10 cm

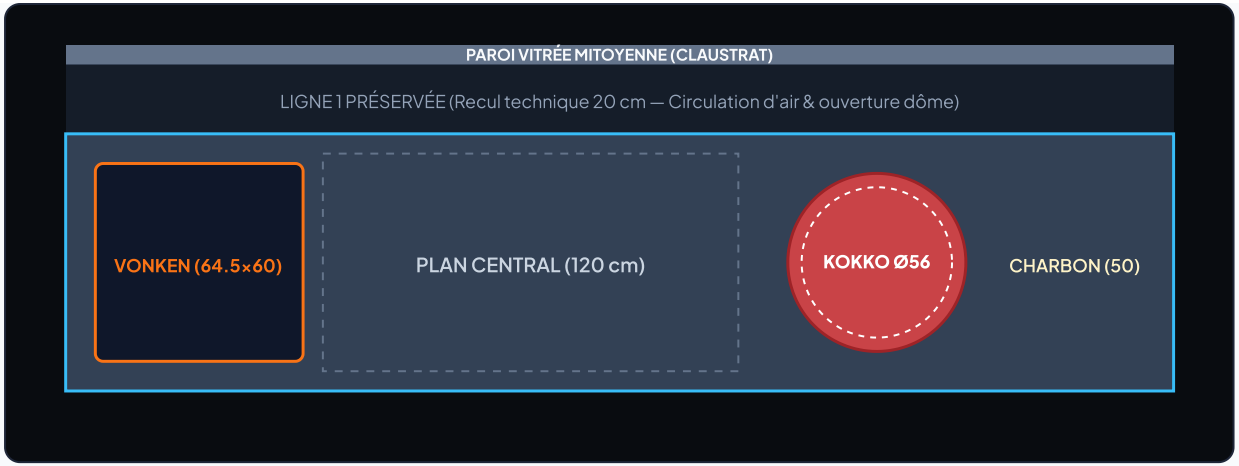


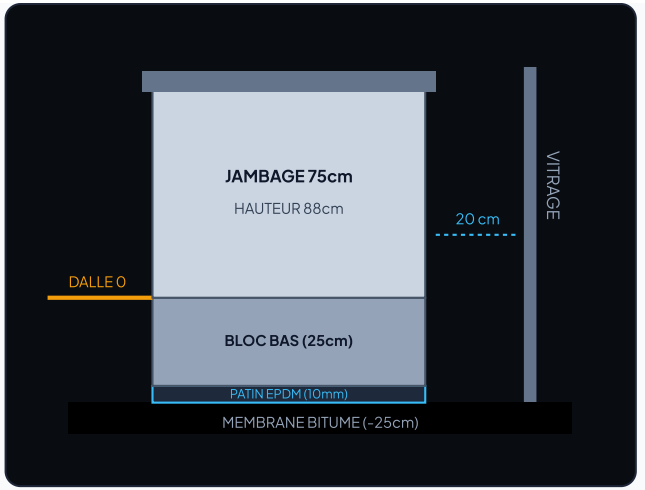
VUE DE DESSUS (3,50 × 0,75 M)

Ligne 1 intacte (20 cm)

COUPE LATÉRALE

Profil & Vide


PAROI VITRÉE MITOYENNE (CLAUSTRAT)
LIGNE 1 PRÉSERVÉE (Recul technique 20 cm — Circulation d'air & ouverture dôme)
VONKEN (64.5×60)
PLAN CENTRAL (120 cm)
KOKKO Ø56
CHARBON (50)


JAMBAGE 75cm
HAUTEUR 88cm
20 cm
VITRAGE
DALLE 0
BLOC BAS (25cm)
PATIN EPDM (10mm)
MEMBRANE BITUME (~25cm)

PRÉPARATION & BUDGET

BUDGET TOTAL : ~390 € TTC
APPROVISIONNEMENT : Leroy Merlin Lyon

CALEPINAGE DES BLOCS, LISTE DE COURSES & CONSEILS

Feuille de préparation pour le sciage et approvisionnement Leroy Merlin

🧱 Fiche de Débit des Blocs Siporex (62,5 × 25 × 10 cm)

POSTE / ÉLÉMENT	DÉCOUPE / FORMAT	QTÉ BLOCS
1. Soubassement (-25 cm)	Blocs entiers posés au fond du vide	8 blocs
2. Jambages verticaux (6 montants)	Hauteur 63 cm (2,5 rangs de blocs)	18 blocs
3. Plateaux horizontaux (88 cm)	Dalles supérieures armées / collées	16 blocs
4. Tablette décaissée Kokko (+45 cm)	Assise renforcée 75 × 75 cm	4 blocs
5. Plinthe sol & traverses arrière	Bandeaux de calage et raidisseurs	6 blocs
TOTAL À COMMANDER (avec 5% casse)		52 blocs

🛒 Liste de Courses & Budget Estimatif

DÉSIGNATION MATÉRIAUX	P.U.	TOTAL TTC
52 Blocs Siporex Ytong 62,5 × 25 × 10 cm	3,90 €	202,80 €
2 Sacs Mortier-Colle Béton Cellulaire (25 kg)	14,50 €	29,00 €
6 Patins EPDM résilients 100×100×10 mm	2,80 €	16,80 €
Kit Béton Ciré Extérieur (Primaire + Enduit + Vernis PU)	89,00 €	89,00 €
Tasseaux Teck/Mélèze & Quincaillerie placards	–	45,00 €
Support mural inox pour 2 pelles à pizza	15,00 €	15,00 €
BUDGET TOTAL MATÉRIAUX ESTIMÉ		~397,60 €

🛡️ Étanchéité & Face Arrière

Ne tentez pas d'enduire l'arrière une fois le meuble monté. Badigeonnez les chants arrière d'un enduit hydrofuge ou d'un primaire étanche

🔥 Ouverture du Kamado Kokko

Le dôme bascule vers l'arrière lors de l'ouverture. La bande de dalles 1 laissée libre assure le **recul technique obligatoire de 20 cm**. Le couvercle

🧰 Découpes faciles à la scie

Le Siporex se découpe sans poussière lourde avec une scie égoïne gros grain spéciale béton cellulaire (dents carbure). Munissez-vous d'une

au sol avant la pose. L'arrière des placards doit rester ouvert pour ventiler le gaz.

s'ouvre complètement sans jamais frotter le claustra vitré.

équerre de maçon pour garantir des coupes d'onglets et d'angles à 90° parfaits.
